

आ.व.२०७९-०८०को वार्षिक प्रगति विवरण

पुर्वाधार विकास समित
प्राविधिक शाखा
फिदिम नगरपालिकाको कार्यालय
फिदिम, पाँचथर
२०८०/०४/०७

आ.व.२०७९/०८० मा सम्पन्न गरिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको संख्यात्मक प्रगति विवरण


- आ.व. २०७९/०८० मा संचालित आयोजना/कार्यक्रमहरूको संक्षिप्त विवरण

निकाय	योजना संख्या	संभौता सम्पन्न	सम्पन्न संख्या	प्रगति प्रतिशत
Muni	506.00	502.00	489.00	96.64
W1	10	10	10	100.00
W2	11	11	11	100.00
W3	11	11	11	100.00
W4	23	23	23	100.00
W5	7	7	7	100.00
W6	14	14	14	100.00
W7	18	18	18	100.00
W8	13	13	13	100.00
W9	7	7	5	71.43
W10	21	21	21	100.00
W11	14	14	14	100.00
W12	8	8	8	100.00
W13	11	11	11	100.00
W14	13	13	13	100.00
Total	687	683	668.00	97.23

- यस अविधमा कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना संख्याहरु काम हुन नसकेका [काम हुन नसकेका.docx](#)

- संझौता हुन नसकेका आयोजनाहरु - ४ वटा
- संझौता भैइ सम्पन्न/कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरु ९ वटा
- ठेक्का व्यवस्थापनबाट निर्माणाधिने आयोजनाहरु - ३ वटा
- वार्षिक/सालवसाली रुपमा सम्पन्न भएपनि अधुरा भवनहरु २३ वटा
 - नगर तर्फका - १२ वटा
 - कोशी प्रदेश सरकार - ९ वटा
 - राश्ट्रपती शैक्षिक सुधार २ वटा

Progress Report up to 080-3-24

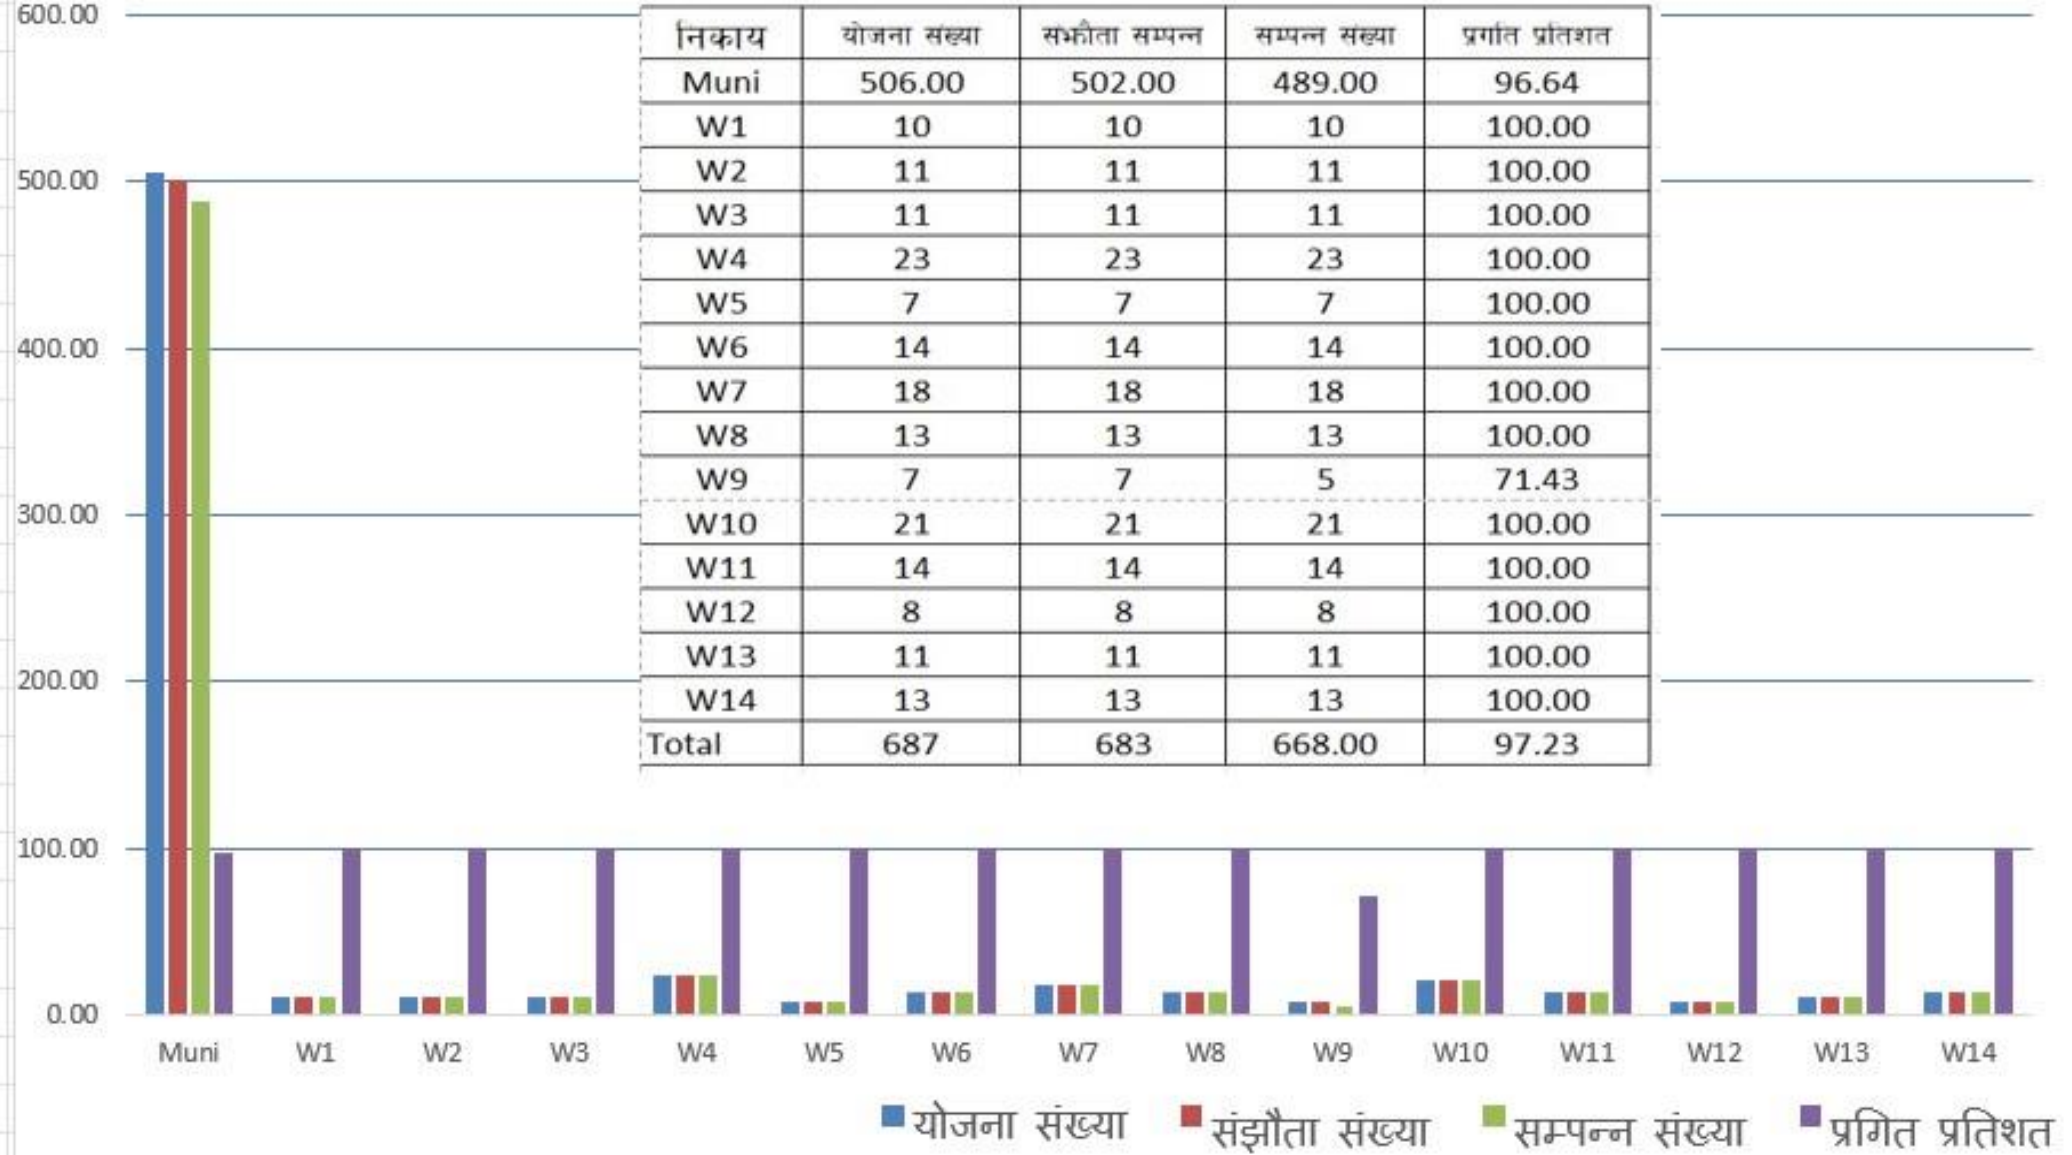

आ.व.२०७९/०८० को आयोजना/कार्यक्रमा भएका कृयाकलापहरुको भौतिक प्रगति

[Progress summary 079-80.xlsx](#)

• निर्माण तर्फ

फिदिम नगरपालिकाको कार्यालय									
फिदिम, पाँचथर									
पुर्वाधार विकास समित									
प्राविधिक शाखा									
आ.व.२०७९-०८० मा संचालित आयोजना/कार्यक्रमहरूको भौतिक प्रगित विवरण									
सि.नं.	आयोजना/कार्यक्रम	कृयाकलापहरु	इकाइ	लक्ष्य		प्रगित		कैफियत	
				परिमाण	विनियोजित रकम	परिमाण	प्रतिशत		
निर्माण तर्फ									
१.	सडक	ड्र्याक खोल्ने काम	कि.मि.	10		24.29	242.9		
१.१		मर्मत संभार	कि.मि.	100		97.178	97.18		
१.२		स्तरोन्नती	कि.मि.	30		20.576	68.59		
१.३		सतह सोलिड	कि.मि.	15		15.386	102.6		
१.४		सतह ग्राभेल	कि.मि.	5		5.24	104.8		
१.५		सतह कालोपत्रे	कि.मि.	1.9		1.9	100		
१.६		सतह ढलान	कि.मि.	1		0.533	53.3		
१.७		पक्की नाली निर्माण	कि.मि.	6		5.934	98.9		
१.८		कच्चे निर्माण	गोटा	5		5	100		
१.९		कच्ची नाली निर्माण	कि.मि.	5		5	100		
		ड्रेनेज क्रसीड	गोटा	10		12	120		
		टेवा पर्खाल निर्माण	मि.						
		ग्याविन टेवा पर्खाल	मि.	400		390	97.5		
		मेशनरी टेवा पर्खाल	मि.	300		310	103.3		
२.	पुल निर्माण								
२.१		झोलुङ्गे पुल	गोटा	2		1.8	90		
		फड्के	गोटा	1		1	100		

• निर्माण तर्फ क्रमश

सि.नं.	आयोजना/कार्यक्रम	कृयाकलापहरु	इकाइ	लक्ष्य		प्रगति			कैफियत
				परिमाण	विनियोजित रकम	परिमाण	प्रतिशत	वित्तिय प्रतिशत	
३.	भवन निर्माण/मर्मत								
३.१		विद्यालय भवन निर्माण	गोटा	10		9	90		
३.२		विद्यालय भवन मर्मत	गोटा	31		31	100		
३.३		सामुदायिक भवन निर्माण	गोटा	24		21	87.5		
३.४		सामुदायिक भवन मर्मत	गोटा	6		6	100		
३.५		प्रशासनिक भवन निर्माण (न.पा.)	गोटा						
३.६		वडा कार्यालय भवन	गोटा	3		2.1	70		
४.	शौचालय	शौचालय निर्माण	गोटा	15		15	100		
५.	पर्यटन पुर्वाधार निर्माण								
५.१		सिडि मार्ग निर्माण	मि.	१६००		१५३१	95.69		
५.२		पार्क निर्माण	गोटा	13		13	100		
५.३		गेट निर्माण	गोटा	0		0			
५.४		भ्युटावर निर्माण	गोटा	1		0.85	85		
५.५		साइकल ड्र्याक निर्माण	कि.मि.	5		3.5	70		ब.ब.
५.६		झरना व्यवस्थापन	गोटा	1		1	100		
		मुर्ति तथा स्तम्भ	गोटा						
		सडक सतहमा ढुंगा छान्नेकाम	कि.मि.	1		0.7	70		ब.ब.

• निर्माण तर्फ क्रमश.

सि.नं.	आयोजना/कार्यक्रम	कृयाकलापहरु	इकाइ	लक्ष्य		प्रगति			कैफियत
				परिमाण	विनियोजित रकम	परिमाण	प्रतिशत	वित्तिय प्रतिशत	
६	सिंचाइ								
६.१		पक्की सिंचाइ कुलो निर्माण	कि.मि.	7		7.131	101.9		
६.२		पोलिथिन पाइप	मि.	1000		985	98.5		
६.३		इन्टेक	गोटा	3		3	100		
६.४		सिल्ट्रेसन च्याम्बर	गोटा	4		4	100		
६.५		रोड क्रसीड	गोटा	3		3	100		
६.६		कभर क्यानल	मि.	७५		75	100		
६.७		सुपरप्यासेज	मि.	12		12	100		
६.८		सिंचाइ कुलो निर्माण	गोटा	2		2	100		
६.९		सिंचाइ कुलो मर्मत	गोटा	29		29	100		
७	खानेपानी								
७.१		मुहान संरक्षण	गोटा	12		12	100		
७.२		पानी पोखरी निर्माण	गोटा	11		11	100		
		मर्मत संभार	गोटा	23		23	100		
		नयाँ खा.पा. निर्माण	गोटा	9		9	100		
८	मठ मन्दिर, गुम्बा, चर्च निर्माण, मर्मत								
८.१		मन्दिर निर्माण	गोटा	13		13	100		
८.२		गुम्बा निर्माण	गोटा	7		7	100		
८.३		मन्दिर मर्मत	गोटा	12		7	58.33		
		गुम्बा मर्मत	गोटा	6		6	100		
		चर्च निर्माण	गोटा	2		2	100		

• निर्माण तर्फ क्रमश.

सि.नं.	आयोजना/कार्यक्रम	कृयाकलापहरु	इकाइ	लक्ष्य		प्रगित			कैफियत
				परिमाण	विनियोजित रकम	परिमाण	प्रतिशत	वित्तिय प्रतिशत	
९	खेल मैदान								
९.१		सुधार, विस्तार	गोटा	८		८	१००		
९.२		निर्माण	गोटा	१		१	१००		
९.३		मर्मत	गोटा	२		२	१००		
१०.	विद्यालय तथा संघ संस्था घेरावारा	घेरावा निर्माण	मि.	१६००		१६१७	१०१.१		
११.	अन्य								
११.१		आर्यघाट निर्माण	गोटा	६		६	१००		
११.२		गोरेटो बाटो निर्माण	गोटा	५		५	१००		
११.३		चौतारा निर्माण	गोटा	३		३	१००		
११.४		मञ्च निर्माण	गोटा	३		३	१००		
		पोखरी निर्माण	गोटा	१		१	१००		

• खरिद तर्फ

सि.नं.	आयोजना/कार्यक्रम	कृयाकलापहरु	इकाइ	लक्ष्य		प्रगित			कैफियत
				परिमाण	विनियोजित रकम	परिमाण	प्रतिशत	वित्तिय प्रतिशत	
	खरिद तर्फ								
१०.१		पोलीथीन पाइप खानेपानी प्रयोन)	(कि.मि.	98.317		98.317	100		
		पोलीथीन पाइप सिंचाइ प्रयोज)	(मि.	564		564	100		
१०.२		जस्तापा	बण्डल	689.59		689.5	99.99		
१०.३		ग्याविन तारजाली	थान	677		677	100		
१.४		पोलीथीन ट्यांकी	गोटा	10		10	100		
11	घर नक्शा सम्बन्धी								
११.१		नयाँ नक्शा स्वीकृती	संख्या	25		4	16		
		नयाँ घर निर्माण सम्पन्न	संख्या	25		4	16		
		पुराना अभिलेखीकरण	घर संख्या	50		34	68		

नव प्रवर्तन साझेदारी कोष तर्फ

क. नगर शुशासन तर्फ				
१. मोबाइल एप्लिकेशन तथा कम्प्युटर सफ्टवेर निर्माण				
२. एस एम एस प्रणालीको विकास				
३. च्याट बोट र A.I. web site निर्माण संचालन				
४. E-mail/Cloud Service				
५. मानव साधन व्यवस्थापन प्रणालीको विकास H.R.M.S				
६. E-Attendance System को विकास				
७. योजना अनुगमन तथा व्यवस्थापन प्रणाली (PMES and PMS				
८. नगर तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली M.D.M.S.				
९. तालीम पोर्टल निर्माण (तालीम सामग्रीहरु Storege, Review)				
१०. विपद व्यवस्थापन सूचना प्रणाली D.M.I.S.				
११. नागरिक/सेवाग्राही APP सिफारिस माग्ने				
१२. complain दर्ता APP				
२. कम्प्युटर खरिद			२९ वटा	१०० प्रतिशत
३. प्रिन्टर खरिद			१० वटा	१०० प्रतिशत
४. इ-हाजीरी खरिद तथा जडान			३५ वटा	१०० प्रतिशत
५. जि.पि.एस. खरिद तथा जडान ४ वटा जडान			७ वटा	१०० प्रतिशत

नव प्रवर्तन साझेदारी कोष तर्फ क्रमश...

ख. आय आर्जन तर्फ				
साझेदारी संस्था कञ्चनजंगा टि-स्टेट प्रा.लि. मार्फत भएका कृयाकलापहरु				
१. भुइँ स्याउ उत्पादक कृषक समुह गठन		१५ वटा		
२. विउ उत्पादन		४०००० गोटा	१०० प्रतिशत	
३. भुइँ स्याउ प्रशोधन मेसिन उपकरण		१ सेट	१०० प्रतिशत	
४. सरसफाई मेसिन उपकरण		१ सेट	१०० प्रतिशत	
५. पानि ट्रीटमेन्ट उपकरण		१ सेट	१०० प्रतिशत	
६. दाउरा बाल्ने हिटर		१ सेट	१०० प्रतिशत	
७. भुइँ स्याउ धुने उपकरण		१ सेट	१०० प्रतिशत	

आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयमा देखिएका समस्याहरु

१. सडक बोर्ड तथा झो.प. तर्फका आयोजनाहरुको वार्षिक कार्यक्रमको समर्थन तथा बजेट निकाशा निकाशा ढिलो हुने गरेको।
२. कतिपय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको निर्णय समयमा नहुने ।
३. निर्माण आयोजनाहरुमा जनश्रमदान जुटाउनु पर्छ भन्ने भावनाको कमी । नगद सहभागिता नाम मात्र रहेको ।
४. स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार आयोजनाहरु संझौता हुन नसक्नु ।
५. आयोजन / कार्यक्रमको संख्या बढी हुनु ।
६. कर्मचारीहरु प्रोत्साहित नहुनु ।
७. आर्थिक वर्षको शुरुवातमा तयार पारिएको Action Plan कार्यान्वयन गर्न नसक्नु ।
८. वडा कार्यालय भवन निर्माण १ र ८ निर्माण व्यवसायीबाट ढिलाइ भएको छ (१ न. वडा कार्यालयको लागी सघीय समपुरक बजेट चालु आ.व.मा प्राप्त भएको छैन ।, साथै फाल्गुनन्द सर्कीट समेतमा सोही समस्या रहेको छ) ।
९. आर्थिकवर्षको अन्त्य सम्म पनि संघ तथा प्रदेशबाट आयोजना/कार्यक्रमहरु आइरहनु ।
१०. आयोजना तथा कार्यक्रमको संख्या धेरै भएकोले नियमित अनुगमन तथा सुपरभिजन गर्न समस्या रहेको छ ।।
११. नियमित सुपरभिजन तथा अनुगमन गर्न नसक्दा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा कायम राख्न गारो भएको छ ।

क्रशम

१२. आयोजना तथा कार्यक्रमको संख्या धेरै भएकोले नियमित अनुगमन तथा सुपरभिजन गर्न समस्या रहेको छ ।
१३. सुपरभिजन तथा अनुगमनका समयमा दिइएका सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशनहरु पालना गर्ने उपभोक्ताका पदाधिकारीहरुमा कम चासो रहेको छ ।
१४. नियमित सुपरभिजन तथा अनुगमन गर्न नसक्दा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा कायम राख्न गारो भएको छ ।
१५. धेरै आयोजनाहरु (विशेष गरी भवन निर्माण) पुरा नभई निर्माणाधिन अवस्थामा रहनु
१६. सार्वजनिक सुनुवाइ यथार्थ परक हुन सकेको छैन ।
१७. निर्माण समितिका पदाधिकारीहरु गुणस्तरीय कामको प्रतिस्पर्धाको अलवा अन्य कराहरुमा वढी चासो राख्ने ।
१८. मुर्ति निर्माण, खरिद, ढुवानी तथा स्थापना गर्ने कार्यमा प्रस्ट नर्मस् नुहुनु ।
१९. आ-आफ्नो काम प्रतिको जिम्मेवारी बोधमा कमी ।
२०. निर्णय कार्यान्वयनमा नैराश्यता हो की ?
२१. निर्माण कार्यलाई गुणस्तर बनाउन दक्ष कामदारको खाँचो रहेको छ ।

समस्या समाधानका उपायहरू (हुन सक्छ) क्रमश

१. समयमा नै माथिल्लो तहबाटै पहल हुनु पर्छ ।
२. समयमा नै आयोजनाहरूको निर्णय हुनु पर्छ ।
३. उपभोक्ता समितिबाट गरिने निर्माण कार्यहरूमा उपभोक्ताको भूमिकाको बारेमा जानकारी गराउनु पर्छ वा ठेक्का व्यवस्थापन मार्फत काम गर्ने ।
४. तोकिएको समय सिमाको सवैबाट पालना गर्नु पर्छ र समय सिमा नाघेका आयोजनाको संझौता गर्नु हुन्न ।
५. नगरबाट संचालन गरिने आयोजना रु ५ लाख भन्दा कमको नराख्ने ।
६. कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन र दण्डकोको थालनी गर्ने र फिल्डमा खटिने प्राविधिकहरू लाई समयानुकूल तालीम , लगायत प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।
७. तयार पारीएको Annual Action Plan अनुसार कामको प्रगतिको बारेमा हरेक त्रैमासिकरूपमा आन्तरिक समिक्षा हुनु पर्छ ।

क्रमश

८. वडा नं. १ को निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही र ८ को लाइ चेतावनी गर्ने की
९. आयोजना मागको सिफारिसको समय सिमा तोक्ने ।
१०. यातायातका साधनहरुको उचित परिचालन गर्न पर्ला र अनगमन कर्ताहरुलाई कम्तीमा खाना र खाजा खर्चको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
११. अनगमनलाई थप व्यवस्थित गर्दै सुपरीवेक्षणमा खटिएका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई समयानुलको तालीम लगायत प्रोत्साहीत गर्न पर्छ ।
सवै योजना तथा कार्यक्रमहरुमा योजना किताबको प्रयोग अनिवार्य गर्नु पर्छ ।
१२. योजना संख्या कम
१३. अनगमन समितिको सझाव कार्यान्वयन नगर्ने उ.भो.स./ निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोक्न सक्नु पर्छ ।

क्रमशः.....

१४. अनुगमनलाइ थप व्यवस्थित गर्दै सुपरीवेक्षणमा खटिएका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाइ समयानुलको तालीम लगायत प्रोत्साहीत गर्नु पर्छ ।
सवै योजना तथा कार्यक्रमहरुमा योजना किताबको प्रयोग अनिवार्य गर्नु पर्छ ।
१५. अति आवश्यक भवन बाहेक बजेट विनियोजन गर्न नहुने / प्राथमिकताका आधारमा क्रमीकरूपमा निर्माण गर्नु पर्ने ।
१६. निश्चित सिमा भित्रका आयोजना/कार्यक्रमहरुको निर्माण पूर्व र निर्माण पश्चात (Pre-Construction & Post Construction Public Hearing) का सार्वजनिकसुनुवाइ लाइ अनिवार्य गर्नु पर्छ र कर्मचारीहरुको अनिवार्य उपस्थिति हुनु पर्छ ।
१७. समितिमा लाभको पदमा रहेको व्यक्ती नराख्ने, आयोजना संचालनमा पारदर्शीता, गणस्तरीय निर्माण कार्य र समितिका पदाधिकारीहरुलाइ उत्तरदायी बनाउने ।
१८. यस्ता प्रकृतीका आयोजनाहरुलाइ प्राथमिकता नदिने ।
१९. सरोकारवाला सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारी पूर्वक पुरा गर्ने ।
२०. आफुले गरेको निर्णय प्रति प्रतिवद्ध हुनु पर्छ
२१. हरेक वडामा निर्माण कर्मीहरुको तालीम संचालन गर्ने ।

अनुगमन, निरिक्षण तथा मुल्यांकन

- अनुगमन, मुल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण अन्तरगत कृत्याकलापहरु
 - अनुगमन अभिलेख (अनुसुची 1) <..\अनुगमन\Form and Format\अनुगमन अभिलेख अनुसुची १.docx>
 - वार्षिक अनुगमन प्रतिवेदन (अनुसुची ४) <..\अनुगमन\Form and Format\चौमासिक अनुगमन प्रतिवेदन अनुसुची ४ -080-2-30.docx>
- अनुगमन गर्नु पर्ने आयोजना संख्या (लक्ष) - ३२५ गोटा
- अनुगमन गरेको आयोजना संख्या वा पटक (प्रगति) - ३०८ गोटा
- प्रगति प्रतिशत - ९४.७७
- अनुगमन गरेको जम्मा संख्या / पटक - ३३८ पटक

अनुगमनको क्रममा लिएका केही तस्विरहरु

- कुवापानी आ.वि. प्यारापेट निर्माण १४ नं.



- कुवापानी आ.वि. प्यारापेट निर्माण १४ नं.



- ठुलो च्याने-जल्पा पर्यटन सिडी मार्ग १४ नं.



च्याब्रुडः स्तम्भ निर्माण ७ नं.



नाम्दुखोला मलामी घर ३/७ नं.



८ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण, टावरडाडा





सुम्हालुङ मन्दीर घेरावारा निर्माण गढी ४ नं.





३ नं. वडा कार्यालय टेवा पर्खाल निर्माण



इत्थुड खोला-तमाखे-घलेगाउ सिंचाइ ८ नं.





आप्तावा-बाँस्बोटे गोरेटो बाटो निर्माण १४ नं.





सियोतप्पा-खाम्चिना-फेमेसुवा सडक स्तरोन्नती ९ नं.





दुमा-सागुबोटे सडक स्तरोन्नती १ नं.







आ.व.०७९-०८० मा आयोजना/कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था

आयोजनाको कार्ययोजना,संझौता तथा सम्पन्नको अवस्था

